

Ponuda – D&ST Grow & Reward (revizija 2)

Sep 28, 2026 · @Matej Hanzlić

1. Sažetak predloženog rješenja i stupanj funkcionalne pokrivenosti

Nudimo namjenski razvijenu web aplikaciju na Laravelu, s prijavom postojećim Microsoft 365 računima, isporučenu u četiri faze koje poštuju sve zadane rokove, za 114.300,00 EUR bez PDV-a (254 čovjek-dana).

Za Končar D&ST već razvijamo i održavamo intranet na istoj tehnologiji (Laravel, MySQL), s obavijestima preko Microsoft 365 i dnevnim uvozom HR exporta zaposlenika s organizacijskom strukturom i nadređenima. To znanje o organizaciji i sustavima Naručitelja skraćuje analizu i smanjuje rizik prvog, najkraćeg roka.

Opseg rješenja:

- **Četiri modula:** godišnje nagrađivanje, godišnje napredovanje (horizontalno, Junior → Standardna, Standardna → Napredna), mjesečne stimulacije i kvartalne nagrade.
- **Digitalni obrasci** OB-0493, OB-0494, OB-0495 i Obrazac za procjenu – godišnja nagrada: automatsko povlačenje master podataka, DA/NE provjere, eliminacijski kriteriji, obvezni primjeri iz prakse i blokada slanja nepotpunog prijedloga.
- **Linije odobravanja prema dijagramima toka Naručitelja:** dodatni odobravatelji za određene odjele (u proizvodnji SET dvije razine), HR u liniji napredovanja i nagrađivanja, odobravatelj najviše razine na kraju; svako odbijanje vraća prijedlog rukovoditelju na doradu uz e-mail obavijest.
- **Zajedničke cjeline:** master podaci s poviješću važenja, administracija rukovoditelja i linija odobravanja (do 4 razine), ciklusi i zaključavanje razdoblja, budžeti (dodijeljeno / rezervirano / iskorišteno / raspoloživo) i preraspodjele, e-mail obavijesti i podsjetnici, izvještaji i dashboardi s izvozom u Excel, izvozi za HRNET, audit trail.
- **Prava pristupa** prema ulozi i organizacijskoj nadležnosti, uključujući vidljivost bruto plaća i disciplinskih mjera.
- **Okruženja:** zasebno testno i produkcijsko, za oko 120 korisnika i do 40 istovremenih.

Nova aplikacija zamjenjuje postojeće rješenje za stimulacije i kvartalnice; raspored ekrana i nazivi radnji (Spremi, Predaj na odobrenje, Odobri, Odbaci) zadržavaju se gdje je moguće.


Kategorija	Udio u opsegu rada (procjena)	Što obuhvaća
Standardno	oko 15 %	prijava Microsoft računom, okruženja, Excel/CSV uvoz i izvoz, redovi poruka, tehnički audit
Konfiguracija	oko 25 %	parametri koje HR mijenja sam: postoci, apoeni, faktori, limiti, pravila 50 % / 75 %, predlošci obavijesti, linije odobravanja
Prilagodba	oko 15 %	logika postojeće aplikacije za stimulacije i kvartalnice, prenesena i proširena
Razvoj	oko 45 %	obrasci, napredovanje, nagrađivanje, budžeti i preraspodjele, izvještaji za Upravu

Zahtjeve koje ne nudimo navodimo u tč. 3 i 10; pitanja i alternative u tč. 11.

2. Arhitektura, tehnološki stog, model hostinga, autentikacije i licenciranja

Rješenje je jedna Laravel web aplikacija s modularnom poslovnom logikom i jednom MySQL bazom, u odvojenom testnom i produkcijskom okruženju.

Jedna Laravel aplikacija, prijava preko Entra ID-a, podaci u jednoj bazi

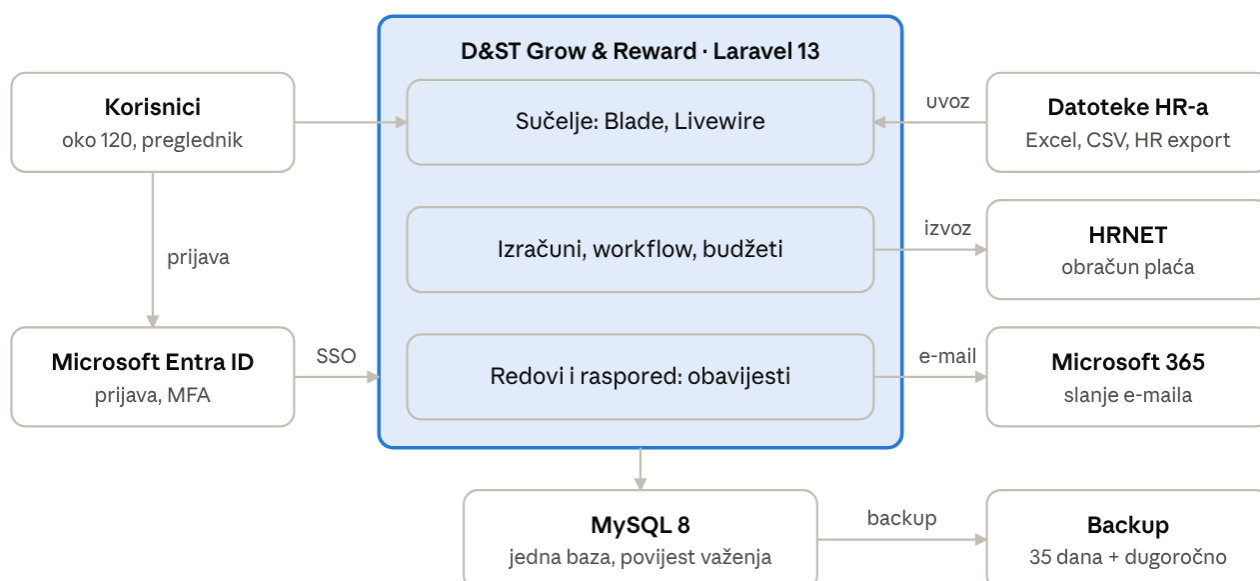

arhitektura rješenja · komponente i integracije

Korisnik se prijavljuje Microsoft računom; aplikacija zatim iz administracije rukovoditelja sama određuje ulogu i nadležnost, pa se prava ne održavaju na dva mjesta.

Područje	Ponudeno rješenje
Arhitektura	Troslojna web aplikacija: sučelje, servisni sloj poslovnih pravila (izračuni, workflow, budžeti), sloj podataka. Pravila i dozvole provjeravaju se na poslužitelju za svaki zahtjev, ne samo u sučelju.
Tehnološki stog	Laravel 13 (PHP 8.3+), Blade i Livewire, Eloquent ORM, MySQL 8, Laravel Excel / PhpSpreadsheet (.xlsx, .csv), Laravel Queues i Scheduler za obavijesti i podsjetnike, Microsoft Graph za e-mail.
Hosting (preporuka)	Azure pretplata Naručitelja, EU regija: Azure App Service za Linux (PHP), Azure Database for MySQL – Flexible Server, Blob Storage, Key Vault, Azure Monitor. Naručitelj je vlasnik okruženja i podataka.
Hosting (alternativa A)	Hosting kod Ponuditelja na upravljanoj Linux infrastrukturi, na kojoj radi i intranet Končar D&ST, na zasebnom poslužitelju i bazi, uz mjesečnu naknadu.
Hosting (alternativa B)	On-premise: Linux poslužitelj (Ubuntu LTS) s Nginxom, PHP-FPM-om i MySQL-om u podatkovnom centru Naručitelja; instalaciju provodi Ponuditelj uz IT Naručitelja.
Autentikacija	Single sign-on s Microsoft Entra ID (OpenID Connect) postojećim poslovnim Microsoft 365 računima; MFA i uvjetni pristup prema politikama Naručitelja; aplikacija nema vlastite lozinke.
Autorizacija	Uloge (HR administrator, rukovoditelj, direktor, član Uprave, predsjednik Uprave) i organizacijska nadležnost iz master podataka i linija odobravanja; HR administratori po potrebi preko Entra grupe.
Licenciranje	Nema licenci po korisniku. Naručitelj dobiva trajno, neisključivo pravo korištenja za neograničen broj korisnika te izvorni kod i dokumentaciju na kraju projekta (prijenos isključivih prava kao opcija, tč. 8). Laravel i korištene komponente su open-source (MIT).

3. Matrica usklađenosti

Sve funkcionalne zahtjeve specifikacije pokrivamo; izvan opsega je samo pet stavki koje specifikacija ne traži ili izričito isključuje. Kategorije: standardno – gotova mogućnost platforme; konfiguracija – HR postavlja sam; prilagodba – postojeća logika ili komponenta koja se proširuje; razvoj – namjenski razvoj; nije podržano – izvan opsega. Konačna matrica po svakoj stavci specifikacije isporučuje se na kraju analize (tč. 4).

Zahtjev / područje	Kategorija	Napomena
Prijava Microsoft računom (SSO), MFA	Standardno	Entra ID, politike Naručitelja
Zasebno testno i produkcijsko okruženje	Standardno	isti kod, odvojene baze i postavke
Audit trail – tehnički okvir	Standardno	bilježenje svake izmjene na razini modela
Uvoz i izvoz Excel / CSV	Standardno	s validacijom po retku
Uloge i prava po organizacijskoj nadležnosti	Prilagodba	uloge + filtriranje po hijerarhiji na poslužitelju
Administracija rukovoditelja i linija odobravanja	Prilagodba	postojeća funkcija, proširena na dodatne odobravatelje po odjelu (do 4 razine, linija SET) i zamjenske odobravatelje
Početni uvoz org. strukture i nadređenih iz HR exporta	Prilagodba	isti export koji već puni imenik na intranetu
Master podaci s poviješću važenja	Razvoj	novi atributi: pozicija, stupanj složenosti, platni razred, sektor, profitni centar
Masovno ažuriranje bruto plaća (Excel)	Razvoj	pregled i validacija prije potvrde
Ciklusi, zaključavanje i otključavanje razdoblja	Razvoj	jedinstveno za sve module
Parametri: postoci, apoeni, faktori, limiti, ključna ekspertna mjesta, pravilo 50 % / 75 %	Konfiguracija	HR mijenja po ciklusu, bez programiranja
Predlošci i pravila e-mail obavijesti i podsjetnika	Konfiguracija	slanje preko Microsoft 365

Zahtjev / područje	Kategorija	Napomena
Stimulacije: unos, izračun, godišnji fond, korekcija za pripravnike	Prilagodba	logika postojeće aplikacije
Kvartalnice: uvoz prisutnosti, pragovi, ponderi, disciplinska mjera	Prilagodba	logika postojeće aplikacije, s prikazom doprinosa kriterija
Izvoz za HR i za Upravu (stimulacije, kvartalnice)	Prilagodba	kao u postojećoj aplikaciji, uz format za HRNET
Godišnje napredovanje: tri obrasca, DA/NE provjere, HR provjera i dorada	Razvoj	prema OB-0493, OB-0494, OB-0495
Blokada Pripravnika i Juniora 12 mjeseci, praćenje roka za prefiks Senior	Razvoj	vizualna oznaka, podsjetnik HR-u
Primjena nove bruto plaće u master podatke nakon HR potvrde	Razvoj	poluautomatski, s datumom primjene
Godišnje nagrađivanje: obrazac, razine, faktori, limiti, HR provjera, obavijest za razine 1-2	Razvoj	iznos iznad limita samo HR, uz audit
Budžeti: rezervirano / iskorišteno / raspoloživo, preraspodjele, pregled Uprave	Razvoj	po Društvu, profitnom centru, sektoru, odjelu
Masovno i pojedinačno odobravanje, odbijanje s napomenom i vraćanjem na doradu na svakoj razini	Konfiguracija	pravilo po modulu
Izveštaji i dashboardi, izvoz u Excel	Razvoj	presjeci iz tč. 7 specifikacije
Automatska (API) integracija s HRNET-om ili SAP-om	Nije podržano	opcija u tč. 8
Automatska raspodjela iznosa pri promjeni odjela	Nije podržano	specifikacija je ne traži; HR uređuje ručno
Automatski upis nove plaće bez HR potvrde	Nije podržano	specifikacija ga izričito isključuje
Elektronički potpis obrazaca	Nije podržano	odobrenje u workflowu s audit zapisom zamjenjuje potpis


Zahtjev / područje	Kategorija	Napomena
Nativna mobilna aplikacija	Nije podržano	responzivno web sučelje radi na tabletu i mobitelu

4. Plan faza, ključne aktivnosti, rokovi, preduvjeti i ovisnosti o Naručiitelju

Rokovi su izvedivi uz početak rada **Oct 5, 2026** : svaka faza ide u produkciju zadnji radni dan prije roka, a iza svakog puštanja slijede 4 tjedna stabilizacije (tč. 6).

Svaki modul ide u produkciju prije roka Naručiitelja

Razvoj i puštanje po fazama, 2026.–2027.; romb = rok Naručiitelja

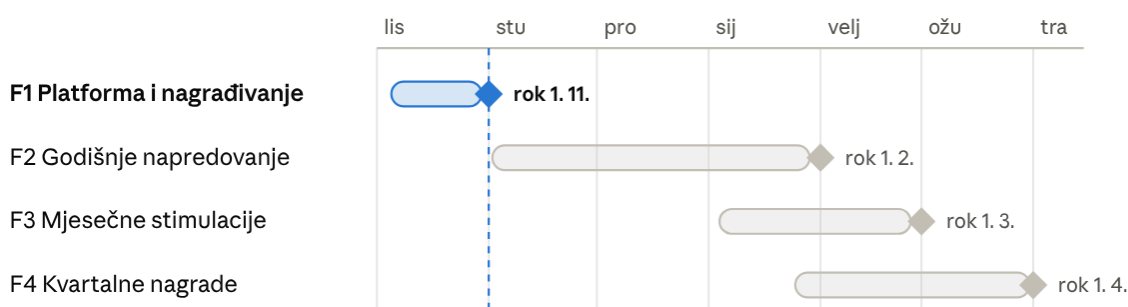

plan faza · 4 faze i rokovi Naručiitelja

Prva faza ima najkraći rok (20 radnih dana), pa u njoj radi prošireni tim (tč. 7), a dashboardi za Upravu mogu se isporučiti tijekom stabilizacije ako analiza pokaže potrebu.

Faza	Ključne aktivnosti	U produkciji
F1	analiza i dizajn (prvi tjedan, zamrzavanje opsega F1), Entra ID i okruženja, master podaci i uvoz org. strukture, uloge i konfigurabilne linije odobravanja (dodatni odobravatelji po odjelu, linija SET), audit, obavijesti, modul godišnjeg nagrađivanja s obrascem, HR provjerom, izvještajima i Excel izvozom, UAT, edukacija	30. 10. 2026.
F2	tri obrasca napredovanja, HR provjera i dorada, budžeti po razinama i preraspodjele, pravilo 50 % / 75 %, primjena nove plaće u master podatke, izvoz za HRNET, izvještaji, UAT	29. 1. 2027.

Faza	Ključne aktivnosti	U produkciji
F3	stimulacije, migracija iz postojeće aplikacije (probna pa konačna), izvozi za HR i Upravu, izvještaji, UAT, isključenje starog modula	26. 2. 2027.
F4	kvartalne nagrade, CSV uvoz prisutnosti s validacijom, migracija povijesnih kvartala, izvještaji, UAT, gašenje postojeće aplikacije	31. 3. 2027.

Preduvjeti i ovisnosti o Naručitelju:

- Potpisan ugovor ili narudžbenica do Oct 2, 2026 .
- Imenovan vlasnik proizvoda iz HR-a s ovlaštenjem za odluke i najmanje 2 sata dnevno u F1, od prve radionice prvog dana rada.
- Odluka o modelu hostinga i otvorena Azure pretplata (ili poslužitelj) do Oct 7, 2026 .
- Administratorska suglasnost za registraciju aplikacije u Entra ID-u i zajednički sandučić za obavijesti do Oct 9, 2026 .
- Master podaci za F1 (stupanj složenosti, ugovorena bruto plaća, pozicija, OIB, SAP šifra) u našem Excel predlošku do 12. 10. 2026.; organizacijsku strukturu i nadređene preuzimamo iz postojećeg HR exporta.
- Pristup bazi ili izvoz podataka postojeće aplikacije za stimulacije i kvartalnice do početka F3.
- Potvrđeni formati uvoza u HRNET po modulu, s primjerom datoteke.
- Testni korisnici i UAT u dogovorenom roku (u F1 najviše 5 radnih dana).
- Odgovori na pitanja iz tč. 11 do kraja analize u F1.

5. Pristup migraciji, integracijama, sigurnosti, audit trailu i zaštiti podataka

Svi uvozi rade po istom načelu – učitavanje, prikaz validacije po retku, potvrda HR-a i zapis u povijest izmjena – a do zaključavanja razdoblja mogu se ponoviti tako da novi uvoz zamijeni prethodni.

5.1 Migracija i uvozi

Vrsta uvoza	Izvor i format	Učestalost
Inicijalna migracija	baza postojeće aplikacije: zaposlenici, rukovoditelji, linije odobravanja, budžeti, povijest stimulacija i kvartalnice; probna migracija u testno okruženje, zatim konačna uz usporedbu kontrolnih zbrojeva	jednokratno, u F3 i F4
Organizacijska struktura	HR export koji Končar već svaki dan šalje intranetu (odjel, profitni centar, radno mjesto, status, nadređeni)	jednokratno; dnevno kao opcija (tč. 8)
Dopuna master podataka	Excel predložak Ponuditelja: OIB, SAP šifra, pozicija, stupanj složenosti, platni razred, grupa radnih mjesta, ugovorena bruto plaća, datum zadnje promjene plaće	jednokratno, zatim po potrebi
Masovno ažuriranje plaća i atributa	Excel s datumom važenja; primjena samo na buduće obračune	po potrebi
Prisutnost za kvartalnice	CSV (OIB, SAP šifra, prezime i ime, prisutnost, fond sati) uz odabir godine i kvartala; status retka: ok / ne postoji u bazi / ne postoji u CSV-u	kvartalno

OIB i SAP šifra su ključevi uparivanja; duplikati OIB-a se odbijaju. Migracija povijesnih napredovanja i nagrada iz Word obrazaca nije u opsegu.

5.2 Integracije

- **HRNET / obračun plaće:** izvoz odobrenih iznosa po modulu u Excel ili CSV s obveznim stupcima iz specifikacije; nakon izvoza status „izvezeno za obračun“. Zadržava se i izvoz za Upravu iz postojeće aplikacije.
- **Microsoft Entra ID:** prijava i, po želji, Entra grupa za HR administratore.

- **Microsoft 365:** obavijesti i podsjetnici preko Microsoft Graph-a sa zajedničkog sandučića Naručitelja, uz evidenciju poslanih poruka – isti način koji već koristimo na intranetu Končar D&ST.

5.3 Prijava

Korisnik se prijavljuje poslovnim Microsoft 365 računom (isti kao za Outlook i Teams), bez zasebne lozinke. MFA i uvjetni pristup nasljeđuju se iz politika Naručitelja. Pristup ima samo korisnik kojeg je HR dodao u aplikaciju; račun se uparuje po e-mail adresi, a deaktivacija u Entra ID-u odmah onemogućuje prijavu. Bilježe se uspješne i neuspješne prijave.

5.4 Audit trail

- Za svaku izmjenu bilježi se korisnik, datum i vrijeme, radnja, objekt (zaposlenik, prijedlog, budžet, ciklus) te stara i nova vrijednost.
- Obuhvaćeni su prijedlozi, statusi, odobrenja i odbijanja s napomenama, HR administrativne izmjene, korekcije i preraspodjele budžeta, uvozi i ponovni uvozi, izvozi, zaključavanje razdoblja i promjene master podataka.
- Zapisi se samo dodaju i ne mogu se mijenjati ni brisati kroz aplikaciju.
- Cjelovitu povijest vide samo HR administratori, s pretragom i izvozom u Excel; odobravatelji vide povijest statusa prijedloga koji odobravaju.
- HR administrativne izmjene ne šalju obavijesti drugim korisnicima.

5.5 Backup i oporavak

- **Azure Database for MySQL:** automatski dnevni snapshot i backup transakcijskog loga svakih 5 minuta, povrat na bilo koju točku u zadnjih 35 dana, geo-redundantna pohrana unutar EU.
- **Dugoročno čuvanje:** tjedni, mjesečni i godišnji logički backup baze u Blob Storage s nepromjenjivom (immutable) politikom, do 10 godina.
- Prije zaključavanja ciklusa i izvoza za obračun aplikacija sprema zasebnu snimku podataka ciklusa.
- Ciljevi oporavka: RPO do 15 minuta, RTO do 4 radna sata; test povrata jednom godišnje, sa zapisnikom.
- Kod hostinga kod Ponuditelja i on-premise vrijede isti ciljevi (dnevni puni backup, binarni log svakih 15 minuta, kopija izvan poslužitelja).

5.6 Sigurnost i zaštita osobnih podataka

- Autorizacija na poslužitelju za svaki zahtjev prema ulozi i nadležnosti; bruto plaće, procjene i disciplinske mjere vidljivi su samo u okviru nadležnosti, a disciplinsku mjeru unosi samo HR.
- Enkripcija u prijenosu (TLS 1.2+) i u mirovanju (AES-256); tajne i ključevi u Key Vaultu.
- Razvoj prema OWASP ASVS, provjera ranjivosti paketa (composer audit, npm audit) pri svakom izdanju.
- GDPR: ugovor o obradi osobnih podataka, obrada u EU, minimalan skup podataka, rok čuvanja prema odluci Naručitelja.
- Pristup Ponuditelja produkcijskim podacima samo po zahtjevu podrške, imenovanim osobama i uz zapis u audit; testno okruženje koristi pseudonimizirane podatke.

6. Pristup testiranju, edukaciji, produkcijskom puštanju i stabilizaciji

Svaka faza prolazi interno testiranje, UAT u testnom okruženju i zapisničko prihvatanje, a nakon puštanja 4 tjedna pojačane podrške.

6.1 Testiranje

- **Automatski testovi izračuna:** svi primjeri iz specifikacije (kvartalnice, primjeri 1–5; razine učinka i faktori; limiti po stupnju složenosti; pragovi prisutnosti; pravilo 2,5 % za pripravnike; pravila 50 % / 75 %) izvode se pri svakoj izmjeni koda.
- **Interno QA testiranje** svake faze: funkcionalno, prava pristupa po ulogama i nadležnosti, uvozi i izvozi, obavijesti.
- **UAT** u testnom okruženju prema scenarijima iz tč. 4, 5 i 15 specifikacije; scenarije priprema Ponuditelj, a HR ih provodi uz našu podršku.
- **Test opterećenja** s 40 istovremenih korisnika; cilj je odziv ekrana ispod 2 sekunde.
- **Kriterij prihvatanja:** svi UAT scenariji izvedeni, bez otvorenih kritičnih i visokih nedostataka; srednji i niski imaju dogovoren rok ispravka.

6.2 Edukacija

Ciljna skupina	Oblik	Trajanje
HR administratori	uživo, u testnom okruženju, po modulu	4 sata po fazi
Rukovoditelji (oko 80)	online (Teams), 3 termina po fazi, sa snimkom	60–90 minuta
Direktori i članovi Uprave	kratka prezentacija odobravanja i izvještaja	45 minuta

Isporučujemo korisničke upute na hrvatskom po ulozi, kratke video upute za unos i odobravanje te administratorski priručnik za HR.

6.3 Produkcijsko puštanje

- Plan prelaska s odgovornima i terminima, dogovoren tjedan dana prije puštanja.
- Konačna migracija i usporedba kontrolnih zbrojeva sa starim sustavom, uz potvrdu HR-a.
- Provjera nakon puštanja (prijava, prava, ključni tijekovi) i odluka HR-a o početku korištenja.
- Za stimulacije i kvartalnice paralelni rad starog i novog sustava jedno obračunsko razdoblje.
- Plan povratka na prethodno stanje u slučaju kritičnog problema.

6.4 Stabilizacija

Nakon svakog puštanja 4 tjedna pojačane podrške: dnevna provjera u prvom tjednu, prioritetno rješavanje prijava, prisutnost tima u prvim danima ciklusa i tjedni izvještaj HR-u. Zatim projekt prelazi na redovno održavanje (tč. 9).

7. Projektni tim, uloge i relevantne reference

Na projektu radi tim od 8 osoba; u F1 je angažman veći zbog roka od 20 radnih dana, a od F2 se smanjuje.

Uloga	Odgovornost	Angažman F1	Angažman F2–F4	Ime
Voditelj projekta	plan, rokovi, rizici, statusni sastanci s vlasnikom proizvoda	50 %	25 %	[upisati]

Uloga	Odgovornost	Angažman F1	Angažman F2-F4	Ime
Poslovni analitičar	pravila, validacije, UAT scenariji, upute, edukacija	100 %	50 %	[upisati]
Tehnički voditelj (Laravel)	arhitektura, sigurnost, Entra ID, pregled koda, migracija	100 %	50 %	[upisati]
Laravel/PHP full-stack razvojni inženjer (3)	moduli, obrasci, izvještaji, uvozi i izvozi	3 × 100 %	2 × 100 %	[upisati]
QA inženjer	testni planovi, automatski testovi izračuna, regresija	100 %	50 %	[upisati]
DevOps inženjer	okruženja, CI/CD, backup, nadzor	20 %	10 %	[upisati]

Reference:

Naručitelj	Rješenje	Razdoblje	Kontakt
Končar D&ST	Intranet (Laravel, MySQL): dnevna sinkronizacija HR exporta s organizacijskom strukturom i nadređenima (oko 940 zaposlenika) preko API-ja, obavijesti preko Microsoft 365, workflow inicijativa s rokovima i podsjetnicima, prijava nepravilnosti, push obavijesti	od 2024., u radu i održavanju	[upisati]
[upisati]	[HR / workflow odobravanja / obračun varijabilnih primanja]	[upisati]	[upisati]
[upisati]	[upisati]	[upisati]	[upisati]

8. Komercijalni model (svi iznosi bez PDV-a)

Jednokratna cijena implementacije je 114.300,00 EUR za 254 čovjek-dana po jedinstvenoj dnevnoj cijeni od 450,00 EUR; periodično održavanje je 1.200,00 EUR mjesečno, uz infrastrukturu koju Naručitelj plaća izravno ili kod Ponuditelja.

8.1 Jednokratni troškovi po modulu i zajedničkim komponentama

Stavka	Čovjek-dana	Iznos (EUR)
Zajedničke komponente	88	39.600,00
Analiza i dizajn (radionice, pravila, prototip ekrana)	12	5.400,00
Platforma: prijava, uloge i nadležnost, audit, razdoblja, okruženja	18	8.100,00
Master podaci, uvozi, org. struktura iz HR exporta	14	6.300,00
Administracija rukovoditelja i linija odobravanja	8	3.600,00
Workflow s konfigurabilnim linijama odobravanja (do 4 razine), budžeti i preraspodjele	19	8.550,00
Obavijesti i podsjetnici	7	3.150,00
Okvir izvještaja i dashboarda, Excel izvozi	10	4.500,00
Poslovni moduli	92	41.400,00
Godišnje nagrađivanje	24	10.800,00
Godišnje napredovanje (3 obrasca)	34	15.300,00
Mjesečne stimulacije	16	7.200,00
Kvartalne nagrade	18	8.100,00
Provedba	74	33.300,00
Migracija iz postojeće aplikacije	8	3.600,00
Testiranje i osiguranje kvalitete	22	9.900,00
UAT podrška, edukacija, dokumentacija	14	6.300,00
Puštanja i stabilizacija (4 faze)	12	5.400,00
Upravljanje projektom	18	8.100,00
Ukupno	254	114.300,00

Po fazama:

Faza	Opseg	Čovjek-dana	Iznos (EUR)
F1	platforma i zajedničke komponente, godišnje nagrađivanje	115	51.750,00
F2	godišnje napredovanje, budžeti po razinama i preraspodjele	64	28.800,00
F3	mjesečne stimulacije, migracija	36	16.200,00
F4	kvartalne nagrade, uvoz prisutnosti, migracija	39	17.550,00
Ukupno		254	114.300,00

Cijena uključuje upravljanje projektom, testiranje, dokumentaciju, edukaciju iz tč. 6 i jamstvo od 6 mjeseci od puštanja svake faze (besplatan ispravak nedostataka u odnosu na prihvaćenu specifikaciju). Plaćanje: 20 % po potpisu ugovora, ostatak po zapisničkom prihvaćanju svake faze, razmjerno iznosu faze.

8.2 Periodični troškovi

Stavka	Iznos (EUR)	Napomena
Održavanje i podrška (SLA Standard, tč. 9)	1.200,00 mjesečno	od 1. 12. 2026.; uključuje do 8 sati podrške i manjih izmjena mjesečno, sigurnosne zakrpe i nadogradnje
Azure infrastruktura (test + produkcija)	procjena 150–300 mjesečno	Naručitelj plaća Microsoftu prema potrošnji
Alternativa A: hosting kod Ponuditelja	450,00 mjesečno	uključuje poslužitelje i backup; zamjenjuje prethodnu stavku

Nema licenci po korisniku ni godišnjih licencnih naknada.

8.3 Opcionalni troškovi

Stavka	Iznos (EUR)
Dnevna automatska sinkronizacija org. strukture i nadređenih iz HR porta	1.350,00
SLA Premium (pojačana podrška u rokovima ciklusa, do 16 sati mjesečno)	+600,00 mjesečno

Stavka	Iznos (EUR)
Dodatni razvoj i izmjene izvan opsega	60,00 po satu
Automatska integracija s HRNET-om / SAP-om	procjena 3.600,00–6.750,00, nakon analize
Vanjski penetracijski test prije produkcije	4.000,00
Instalacija u on-premise okruženju (alternativa B)	2.250,00
Dodatni termin edukacije (do 4 sata)	450,00
Prijenos isključivih imovinskih autorskih prava na izvorni kod	17.145,00

8.4 Valjanost i početak

Ponuda vrijedi 60 dana, do **Nov 27, 2026**. Pretpostavljeni početak projekta je **Oct 5, 2026**; svi ciljni rokovi iz zahtjeva su izvedivi uz preduvjete iz tč. 4. Svaki tjedan kašnjenja početka pomiče F1 za tjedan i ugrožava rok od 1. 11. 2026.

9. SLA, održavanje, podrška, nadogradnje i sigurnosne zakrpe

Podrška radi radnim danom od 8 do 16 sati (portal i e-mail, za kritične incidente i telefon), uz ciljanu dostupnost produkcije od 99,5 % mjesečno, izvan najavljenih održavanja i ispada pružatelja infrastrukture.

Prioritet	Opis	Vrijeme reakcije	Rješenje ili zaobilazno rješenje
P1 – kritično	aplikacija nedostupna ili onemogućen ključni proces (unos, odobravanje, izvoz) u roku ciklusa	2 radna sata	8 radnih sati
P2 – visoko	bitna funkcija ne radi, postoji zaobilazni način	4 radna sata	2 radna dana
P3 – srednje	nedostatak bez utjecaja na rokove ciklusa	1 radni dan	10 radnih dana
P4 – nisko / upit	pitanje, kozmetički nedostatak, prijedlog	2 radna dana	u sljedećem izdanju

Eskalacija: P1 odmah voditelju projekta, a ako nije riješen u 4 sata, tehničkom voditelju i vlasniku proizvoda kod Naručitelja.

Održavanje obuhvaća:

- **Sigurnosne zakrpe:** zakrpe PHP-a, Laravela i paketa mjesečno; kritične ranjivosti u 3 radna dana, visoke u 10 radnih dana.
- **Nadogradnje:** prelazak na novu glavnu verziju Laravela i podržanu verziju PHP-a prije isteka sigurnosne podrške (Laravel daje 2 godine sigurnosnih zakrpa po verziji); funkcionalna izdanja do jednom kvartalno.
- **Proces izdanja:** svako izdanje prvo u testno okruženje, u produkciju uz odobrenje HR-a, izvan radnog vremena i uz najavu 3 radna dana ranije; nikad u zadnjim danima ciklusa.
- **Nadzor:** dostupnost, greške i uspješnost backupa, s mjesečnim izvještajem o prijavama i dostupnosti.
- **Godišnja priprema ciklusa:** podrška HR-u pri otvaranju ciklusa napredovanja i nagrađivanja, unutar uključenih sati.

10. Pretpostavke, ograničenja, isključenja iz opsega i rizici

Cijena i rokovi vrijede uz pretpostavke niže; najveći rizik je kratak rok F1, koji smanjujemo proširenim timom i zamrzavanjem opsega F1 nakon prvog tjedna.

10.1 Odgovori na teme iz tč. 9 zahtjeva

Tema	Pretpostavka i predloženo rješenje
Linije odobravanja	Prema dijagramima toka Naručitelja: rukovoditelj → dodatni odobravatelj(i) za određene odjele (u proizvodnji SET dvije razine) → HR (samo napredovanje i nagrađivanje, formalna provjera) → odobravatelj najviše razine. HR postavlja razine i dodatne odobravatelje po odjelu. Odbijanje na bilo kojoj razini vraća prijedlog rukovoditelju na doradu, uz e-mail rukovoditelju i prethodnim odobravateljima, a kod najviše razine i HR administratorima. Zamjenski odobravatelj ili HR iznimno odobrenje uz audit.
Godišnje nagrađivanje	Podržavamo i strogo pojedinačno i masovno odobravanje; uključuje se po modulu, zadano pojedinačno kako traži specifikacija.

Tema	Pretpostavka i predloženo rješenje
HRNET	Datotečni izvoz (Excel ili CSV) po modulu s obveznim stupcima iz specifikacije, validacijom prije izvoza (nedostaje OIB ili SAP šifra, iznos nije odobren) i zapisom izvoza; točan format, kodnu stranicu i razdjelnik potvrđuje Naručitelj primjerom datoteke.
Autentikacija i hosting	Entra ID SSO s MFA-om; preporuka Azure pretplata Naručitelja u EU regiji, uz alternative hostinga kod Ponuditelja ili on-premise (tč. 2). Mrežni preduvjeti: HTTPS pristup aplikaciji i izlaz prema Microsoft 365.
Sigurnost	Backup 35 dana + dugoročno do 10 godina, RPO 15 minuta, RTO 4 radna sata; logovi prijava i audit; privilegirani pristup samo imenovanim osobama, s MFA-om i zapisom.
Migracija	Zaposlenici, rukovoditelji, linije, budžeti i povijest stimulacija i kvartalnica iz postojeće baze; probna migracija, usporedba kontrolnih zbrojeva, potvrda HR-a.
SLA	Radnim danom 8–16 h, četiri prioriteta i eskalacija iz tč. 9; pojačana podrška u rokovima ciklusa kao opcija.

10.2 Pretpostavke

- Ugovor se potpisuje do 2. 10. 2026., rad počinje 5. 10. 2026., a preduvjeti iz tč. 4 ispunjavaju se u navedenim rokovima.
- Osnova opsega su specifikacija „Software_final“ (23. 9. 2026.), obrasci OB-0493, OB-0494, OB-0495 (13. 3. 2026.), Obrazac za godišnju nagradu (10. 2. 2026.) i dijagrami toka odobravanja od 1. 10. 2026.; izmjene nakon analize u F1 rješavaju se zahtjevom za izmjenom. Manje korekcije koje Naručitelj najavi tijekom izrade (do 3 čovjek-dana po fazi) uključene su u cijenu.
- Svi korisnici imaju poslovni Microsoft 365 račun u Entra ID-u Naručitelja.
- Do 150 korisnika i 40 istovremenih; do 2.000 zaposlenika izvršitelja u master podacima.
- Sučelje je na hrvatskom jeziku; iznosi su u EUR bruto, zaokruženi na cente (npr. 1.040,625 → 1.040,63).
- Za proturječja u dokumentaciji primjenjujemo pretpostavke iz tč. 11.

10.3 Ograničenja

- Integracija s HRNET-om je datotečna; automatski prijenos nije u osnovnom opsegu.
- Obavijesti ovise o dostupnosti Microsoft 365 i pravilima filtriranja pošte Naručitelja.
- Dostupnost u Azure modelu ograničena je SLA-om Microsofta za korištene servise.

10.4 Isključenja iz opsega

- Izmjene na HRNET-u, SAP-u i drugim sustavima Naručitelja.
- Čišćenje i ručna dopuna podataka (radi HR, uz naše predloške i provjere).
- Migracija povijesnih napredovanja i godišnjih nagrada iz Word obrazaca.
- Troškovi Azurea, poslužitelja i licenci Microsoft 365.
- Stavke „nije podržano“ iz tč. 3 i opcije iz tč. 8.3 ako nisu naručene.

10.5 Rizici

Rizik	Utjecaj	Mjera
Kratak rok F1 (20 radnih dana)	kašnjenje prvog ciklusa nagrađivanja	prošireni tim, zamrzavanje opsega nakon 1. tjedna, dnevna dostupnost vlasnika proizvoda, dashboardi za Upravu u stabilizaciji
Kašnjenje potpisa, Entra ID suglasnosti ili pretplate	nema okruženja za UAT	zahtjevi odmah po potpisu; privremeno testno okruženje kod Ponuditelja
Nepotpuni master podaci (složenost, pozicija, plaća)	pogrešni izračuni i prava	org. struktura iz HR exporta, validacija pri uvozu, potvrda HR-a prije puštanja
Neusuglašena pravila u dokumentaciji	dorada nakon UAT-a	odluke o pitanjima iz tč. 11 do kraja analize F1, parametrizacija pravila
Preklapanje UAT-a s aktivnim ciklusima HR-a	spor ili nepotpun UAT	unaprijed dogovoreni termini i pripremljeni scenariji
Promjena pravilnika tijekom projekta	dodatni rad, pomak rokova	parametri koje HR mijenja sam; veće izmjene kroz zahtjev za izmjenom

11. Pitanja, odstupanja i alternativna rješenja

Dostavljeni dokumenti razilaze se u nekoliko pravila; za svako navodimo pretpostavku na kojoj se temelji cijena, a sva su pravila u rješenju parametri, pa drugačija odluka Naručitelja ne mijenja cijenu.

11.1 Pitanja i pretpostavke

#	Pitanje	Pretpostavka u ponudi
1	Stimulacije i kvartalnice: dijagram vraća odbijeni prijedlog na doradu, a specifikacija (tč. 2.4 i 3.8) doradu u tim modulima isključuje. Vraća se samo odbijeni zaposlenik ili cijeli prijedlog odjela?	samo odbijeni zaposlenici; ostali ostaju odobreni
2	Nakon dorade prolazi li prijedlog ponovno cijelu liniju ili samo od razine koja ga je odbila?	ponovno cijelu liniju; prethodni odobravatelji dobivaju obavijest
3	Tko je odobravatelj najviše razine po modulu i odjelu (direktor ili član Uprave)?	određuje se po rukovoditelju; u napredovanju uvijek član Uprave
4	Koji odjeli osim proizvodnje SET imaju dodatnog odobravatelja i tko su?	HR postavlja po odjelu u administraciji
5	Masovno odobravanje godišnje nagrade: tč. 5.3 ga isključuje, scenarij testiranja ga traži.	podržano, zadano isključeno
6	Član Uprave predlaže za direktno podređene – tko odobrava takav prijedlog?	predsjednik Uprave ili HR iznimno odobrenje
7	Obrazac godišnje nagrade nudi ocjene 1–4, specifikacija 2–4 (doprinos timu 3–4).	prema specifikaciji
8	Disciplinsku mjeru u kvartalnicama unosi samo HR (tč. 3.5 i 13) ili i rukovoditelj (tč. 3.10)?	samo HR
9	Obrazloženje stimulacije: za svakog zaposlenika (tč. 2.3) ili samo iznad 0 % (tč. 2.6)?	samo iznad 0 %

#	Pitanje	Pretpostavka u ponudi
10	Kako se primjenjuje „pravilo 3 %“ iz scenarija testiranja napredovanja?	parametar ciklusa (postotak budžeta)
11	Granica za Junior napredovanje je 12–24 mjeseca – postavlja li je HR po ciklusu?	da, parametar
12	Računa li se blokada Pripravnika i Juniora od datuma zaposlenja ili početka pozicije?	od datuma zaposlenja
13	Na koji dan i za koji skup zaposlenika vrijede ograničenja 50 % / 75 %?	aktivni izvršitelji na dan otvaranja ciklusa
14	Konačni format uvoza u HRNET po modulu (stupci, tip datoteke, kodna stranica) i postoji li API?	Excel ili CSV prema primjeru
15	Koliko dugo se čuvaju podaci i audit zapisi, i vrijedi li isti rok za deaktivirane zaposlenike?	10 godina, isti rok
16	Zamjenski odobravatelji: automatska delegacija ili samo HR iznimno odobrenje?	zamjenik po rukovoditelju + HR iznimka
17	Naziv OB-0495: „Standardna → Napredna“ (obrazac) ili „→ Senior“ (naziv datoteke)?	Napredna; Senior je naziv nakon 12 mjeseci

11.2 Odstupanja od zahtjeva

- **Potpisi i suglasnosti na obrascima** (rukovoditelj, direktor sektora, HR, Uprava) zamjenjuju se odobrenjima u workflowu s audit zapisom; elektronički potpis nije u ponudi.
- **Istovremena isporuka svih modula** do 1. 11. 2026. nije izvediva; nudimo faznu isporuku prema prioritetima Naručitelja, a svi rokovi po modulu se poštuju.

11.3 Alternativna rješenja

- **Automatska organizacijska struktura:** umjesto ručnog održavanja rukovoditelja i hijerarhije, dnevno preuzimanje iz HR exporta koji Končar već šalje intranetu; HR i dalje ručno određuje linije odobravanja i iznimke (opcija u tč. 8.3).
- **Hosting kod Ponuditelja** na infrastrukturi na kojoj radi intranet Končar D&ST, ako Naručitelj ne želi otvarati Azure pretplatu (tč. 2 i 8.2).

- **Automatska integracija s HRNET-om**, ako HRNET nudi API ili uvoz iz dogovorene mape (opcija u tč. 8.3).
